# Cotización de Software — Aplicación Interactiva Offline

Propuesta de proyecto elaborada tomando como referencia las áreas de conocimiento de la Guía del PMBOK® (PMI).

## 1. Información general

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Proyecto | Aplicación Interactiva Offline |
| Cliente (patrocinador) | Martin Guiner |
| Proveedor (director del proyecto) | Luis Patricio Medina Vargas |
| Fecha | 23/09/2026 |
| Versión | 1.0 |

## 2. Resumen del proyecto

### 2.1 Descripción

Se cotiza el desarrollo de una aplicación web interactiva que funciona 100% en local (localhost), sin conexión a internet. El usuario mira 18 videos organizados en 3 bloques y, al terminar cada video, tiene un tiempo limitado para decidir si el caso es **Culpable** o **Inocente**; cada decisión suma o resta puntos. El tiempo de decisión se acorta bloque a bloque (1:30, 1:00 y 0:30).

### 2.2 Objetivo

Entregar, en el plazo de un mes, una aplicación estable que funcione sin internet, que registre correctamente el puntaje de cada usuario y que cumpla con todos los criterios de aceptación del Anexo A.

# 3. Gestión del alcance

## 3.1 Descripción del producto


La experiencia consta de 3 bloques de 6 videos cada uno (18 videos en total). Tras cada video, el usuario solo puede elegir entre dos opciones: **Culpable** o **Inocente**.

| Bloque | Videos | Tiempo para decidir por video |
|---|---|---|
| Bloque 1 | 1 al 6 | 1:30 |
| Bloque 2 | 7 al 12 | 1:00 |
| Bloque 3 | 13 al 18 | 0:30 |

**Sistema de puntaje**

- Cada decisión (Culpable o Inocente) suma o resta 5 puntos según la respuesta configurada para ese video.
- Si el usuario no selecciona ningún botón antes de que termine el tiempo, se tomará como penalización y se descontarán 10 puntos del puntaje total.
- El puntaje se acumula a lo largo de los 3 bloques.
- Al finalizar cada bloque se muestra una notificación, cuyo contenido se definirá con el cliente.

**Flujo del usuario**

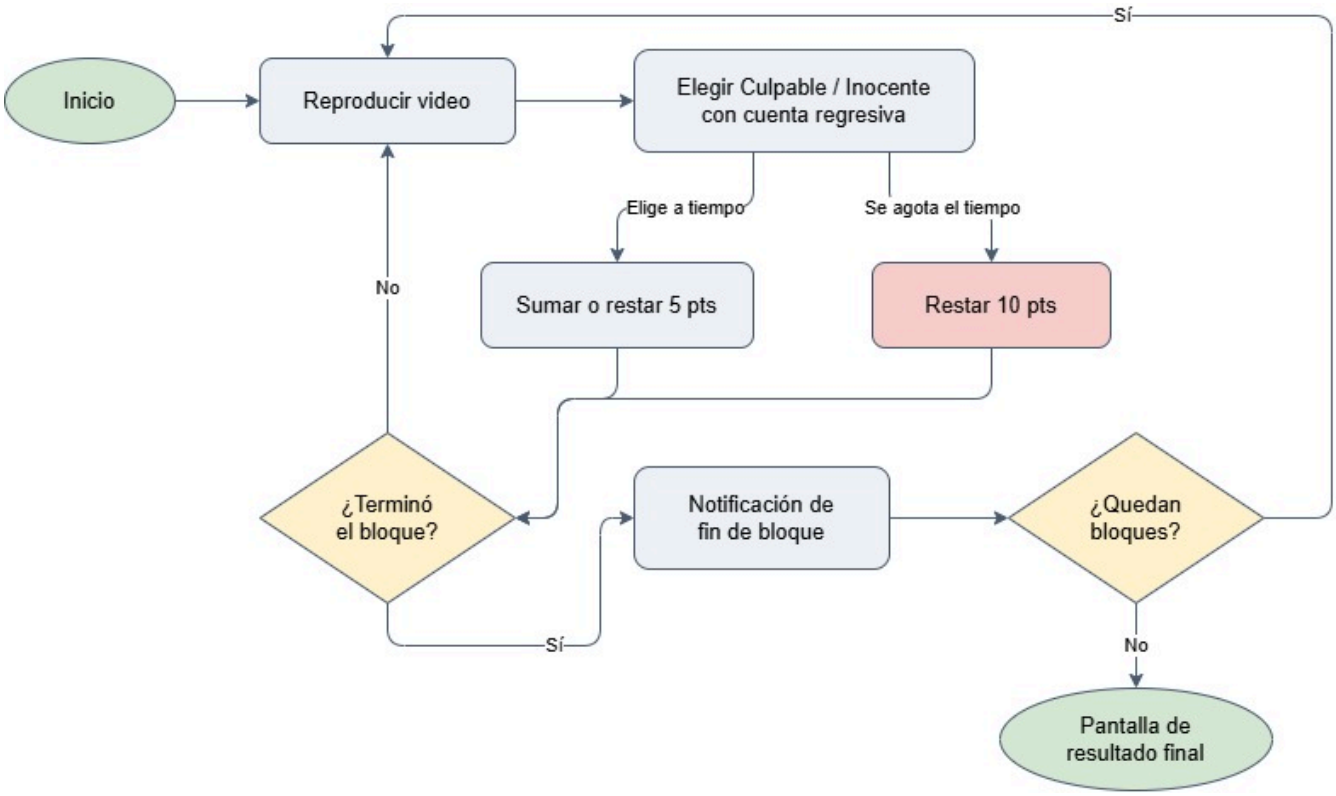


**Especificaciones técnicas**

- **Funcionamiento offline:** la aplicación corre en localhost y no requiere internet; videos, fuentes y recursos se incluyen en el equipo.
- **Tecnología:** aplicación web (HTML, CSS, JavaScript) que corre sobre un servidor local liviano.
- **Videos:** reproducción local de los 18 archivos provistos por el cliente.
- **Clic derecho deshabilitado:** el menú contextual del mouse está bloqueado por defecto para evitar que el usuario descargue, inspeccione o manipule el contenido.
- **Interfaz:** solo dos botones de decisión (Culpable / Inocente), temporizador visible, notificaciones entre bloques y pantalla de resultado final.

El detalle de cada funcionalidad y sus criterios de aceptación se encuentra en el **Anexo A: Requerimientos funcionales**.

## 3.2 Entregables

- Aplicación completa lista para ejecutar en localhost, con los 18 videos integrados.
- Archivo de configuración para definir la respuesta correcta de cada video y los tiempos por bloque.
- Instalación y puesta en marcha en un equipo del cliente.

- Capacitación breve al operador sobre cómo iniciar y reiniciar la aplicación.
- El código fuente es propiedad del cliente.

### 3.3 Estructura de desglose del trabajo (EDT)

1. **Gestión del proyecto:** planificación, reuniones semanales de seguimiento y control de cambios.
2. **Diseño de interfaz:** pantallas de video, decisión, notificaciones y resultado final.
3. **Desarrollo de la aplicación:** reproductor, botones de decisión, temporizador, puntaje y penalización.
4. **Integración y pruebas:** carga de los 18 videos, configuración de respuestas y verificación contra el Anexo A.
5. **Instalación y capacitación:** puesta en marcha en el equipo del cliente y entrega.

### 3.4 Exclusiones

- Producción o edición de los videos.
- Hardware y equipos.
- Guardado de puntajes entre sesiones, historial o ranking.
- Cambios fuera del alcance descrito en este documento, que se cotizarán aparte.

### 3.5 Supuestos y restricciones

- El cliente entrega los 18 videos finales, la respuesta correcta de cada uno y el contenido de las notificaciones entre bloques antes de iniciar el desarrollo.
- La aplicación debe funcionar sin conexión a internet.
- El plazo total del proyecto es de un mes.

## 4. Gestión del cronograma

El plazo total estimado es de un mes, con reuniones semanales para revisar el avance del proyecto.

| Semana | Actividades | Hito |
|---|---|---|
| Semana 1 | Relevamiento y diseño de interfaz | Diseño aprobado por el cliente |
| Semana 2 | Desarrollo de la aplicación | Primera versión funcional |

| Semana | Actividades | Hito |
|---|---|---|
| Semana 3 | Desarrollo, integración de videos y pruebas | Versión completa para revisión |
| Semana 4 | Ajustes finales, instalación y capacitación | Entrega y aceptación |

## 5. Gestión de los costos

El costo total del proyecto es de $300.000 pesos argentinos (ARS).

| Concepto | Monto (ARS) |
|---|---|
| Diseño de interfaz | 100.000 |
| Desarrollo de la aplicación | 100.000 |
| Instalación y capacitación | 100.000 |
| **Total** | **300.000** |

**Forma de pago:** 3 cuotas de $100.000.

## 6. Gestión de la calidad

- Cada requerimiento del Anexo A tiene criterios de aceptación medibles.
- Antes de la entrega, se verifica la aplicación completa contra esos criterios en un equipo sin conexión a internet.
- La entrega se considera aceptada cuando el cliente confirma que se cumplen los criterios de aceptación.

## 7. Gestión de las comunicaciones

- Se incluyen reuniones semanales de seguimiento y feedback según las necesidades del cliente, con ajustes sobre el diseño y el comportamiento.
- En cada reunión se presenta el avance respecto del cronograma y los próximos pasos.

## 8. Gestión de los riesgos

| Riesgo | Impacto | Respuesta |
|---|---|---|
| Demora en la entrega de videos, respuestas o notificaciones | Retraso del cronograma | El plazo de un mes comienza a contar desde que el cliente entrega todo el material. |
| Videos en formatos incompatibles con el navegador | Videos que no se reproducen | Se valida el formato al recibir el material y se acuerda su conversión si hace falta. |
| Equipo del cliente con recursos insuficientes | Reproducción lenta o con cortes | Se prueba la aplicación en el equipo final antes de la entrega. |
| Pedidos de cambio durante el desarrollo | Aumento de costo y plazo | Los cambios fuera del alcance se evalúan y cotizan aparte. |

## 9. Gestión de los interesados

| Interesado | Rol | Participación |
|---|---|---|
| Martin Guiner | Cliente y patrocinador | Aporta el material, aprueba el diseño y acepta la entrega. |
| Luis Patricio Medina Vargas | Director del proyecto y desarrollador | Planifica, desarrolla, instala y da soporte. |
| Usuarios finales | Participantes de la experiencia | Utilizan la aplicación. |

## 10. Garantía y soporte

- Garantía de 30 días posteriores a la entrega para corrección de errores.
- Pasado ese plazo, cada visita a las instalaciones del cliente para solucionar inconvenientes tendrá un costo de $30.000, y la corrección de errores detectados después de los 30 días se cobrará $30.000.

# 11. Aprobación

La firma de este documento confirma la aprobación del alcance, el cronograma y los costos descritos.

| | Cliente | Proveedor |
|---|---|---|
| Nombre | Martin Guiner | Luis Patricio Medina Vargas |
| Firma | | |
| Fecha | | |

---

# Anexo A: Requerimientos funcionales

## RF-01 — Reproducción de videos

El sistema reproduce los 18 videos desde el equipo local, en orden y sin conexión a internet.

**Criterios de aceptación:**

1. Los videos se reproducen en orden del 1 al 18.
2. El usuario no puede adelantar, retroceder ni saltear videos.
3. Al terminar un video se muestran las opciones de decisión.

## RF-02 — Decisión Culpable / Inocente

Al terminar cada video, el usuario elige entre dos botones: **Culpable** o **Inocente**.

**Criterios de aceptación:**

1. Solo se muestran esas dos opciones.
2. Se acepta una única respuesta por video; después de elegir no se puede cambiar.
3. Al elegir, se pasa automáticamente al siguiente video.

## RF-03 — Temporizador de decisión

Al terminar cada video se muestra una cuenta regresiva visible cuya duración depende del bloque.

**Criterios de aceptación:**

1. Bloque 1 (videos 1 al 6): 1:30.
2. Bloque 2 (videos 7 al 12): 1:00.
3. Bloque 3 (videos 13 al 18): 0:30.
4. La cuenta regresiva empieza cuando termina el video, no durante la reproducción.

## RF-04 — Cálculo de puntaje

Cada decisión suma o resta 5 puntos según la respuesta configurada para ese video.

**Criterios de aceptación:**

1. Si la elección coincide con la respuesta configurada, se suman 5 puntos.
2. Si no coincide, se restan 5 puntos.
3. El puntaje se acumula a lo largo de los 3 bloques.

## RF-05 — Penalización por falta de respuesta

Si el tiempo se agota sin que el usuario elija, se aplica una penalización.

**Criterios de aceptación:**

1. Al llegar a 0:00 sin respuesta, se restan 10 puntos del puntaje total.
2. Luego se pasa automáticamente al siguiente video.

## RF-06 — Pantalla de resultado final

Después de la notificación de cierre del Bloque 3, el sistema muestra el puntaje total obtenido.

**Criterios de aceptación:**

1. Se muestra el puntaje final del usuario.
2. Para reiniciar la experiencia para un nuevo usuario, basta con presionar F5: el puntaje vuelve a cero y todo comienza desde el primer video. Los puntajes no se guardan entre sesiones.

## RF-07 — Notificaciones entre bloques

Al finalizar cada bloque, el sistema muestra una notificación al usuario. El contenido y el diseño de cada notificación se definirán con el cliente.

**Criterios de aceptación:**

1. Al terminar el Bloque 1 (video 6) se muestra una notificación antes de comenzar el Bloque 2.
2. Al terminar el Bloque 2 (video 12) se muestra una notificación antes de comenzar el Bloque 3.
3. Al terminar el Bloque 3 (video 18) se muestra una notificación de cierre antes de la pantalla de resultado final.
4. El temporizador de decisión no corre mientras se muestra una notificación.

## RF-08 — Clic derecho deshabilitado

El menú contextual del mouse está bloqueado en toda la aplicación.

**Criterios de aceptación:**

1. Al hacer clic derecho en cualquier parte de la aplicación no aparece ningún menú.
2. No es posible descargar ni guardar los videos desde la interfaz.

## RF-09 — Funcionamiento offline

La aplicación funciona completamente en localhost, sin internet.

**Criterios de aceptación:**

1. Con el equipo desconectado de internet, la aplicación se inicia y funciona de principio a fin.
2. Videos, fuentes e imágenes se cargan desde el equipo local.
